



LA TESTE
DE BUCH
BASSIN D'ARCACHON

TRAVAUX – AVENUE DES OSTREICULTEURS CENTRE-VILLE

MAIRIE DE LA TESTE DE BUCH



BIENVENUE

Mercredi 28 septembre 2022

SOMMAIRE

- 1 Le projet : entre nécessité, sécurisation et embellissement
- 2 Travaux concessionnaires et enfouissement de réseaux
- 3 Phasage des travaux : interventions concessionnaires
- 4 Gestion de la circulation
- 5 La suite des travaux

L'avenue des Ostréiculteurs, un axe reliant la façade maritime au près Salés , tout en ayant une fonction portuaire importante

- Chaussée dégradée (notation globale : 4,7 / 10)
- Pas de trottoir → problème de sécurité pour les piétons
- Pas de stationnements réglementés
- Besoin de renouveler certains réseaux



TRAVAUX CONCESSIONNAIRES

Eau potable

- Réseau AEP vieillissant
- Renouvellement de la canalisation et des branchements
- Travaux gérés par la COBAS – Entreprise : SADE

Réseaux secs

- Réseaux électrique et télécom
- 25 poteaux dans la rue
- Nécessité d'enfouir les réseaux pour dégager les emprises
- Travaux gérés par le SDEEG – Entreprise EIFFAGE ENERGIES

PHASAGE PREVU

**Automne / Hiver 2022 – Printemps 2023 :
Intervention des concessionnaires**

**3 octobre – mi
novembre 2022**
Travaux de
renouvellement de
la conduite d'eau
potable



**Mi novembre 2022
– fin mars 2023:**
Travaux
d'enfouissement de
réseaux




**ARRET DE
CHANTIER EN
PERIODE
ESTIVALE 2023**



**Septembre 2023 –
Juin 2024**
Travaux
d'aménagement

**Chantier
SMPBA**

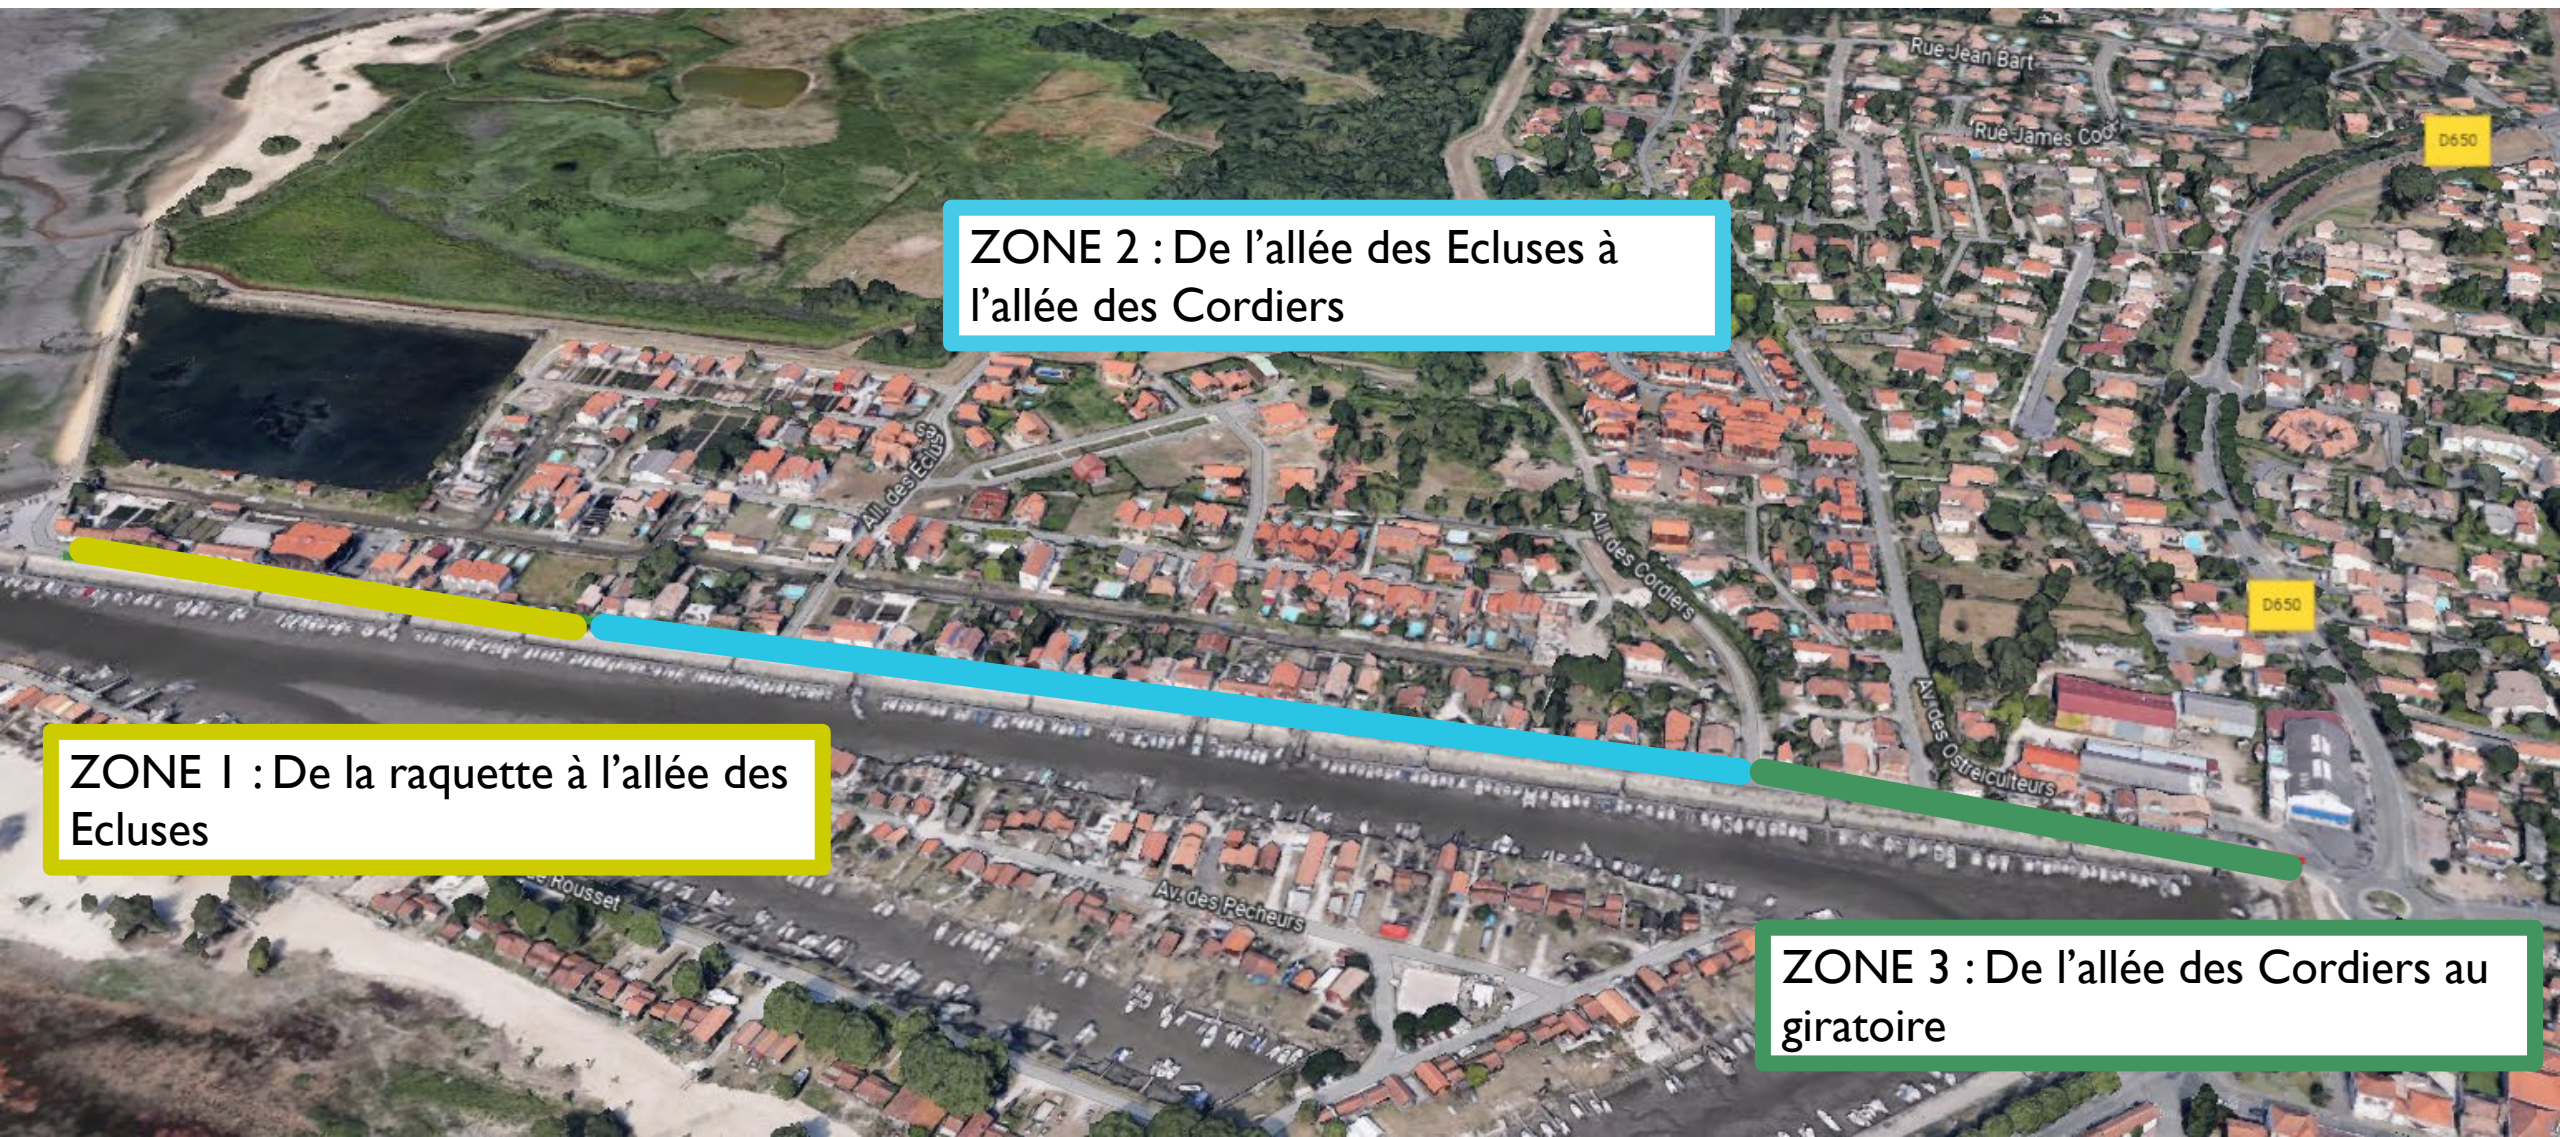

ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

Phase I : ZONE I

DU 3 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE

Travaux : Renouvellement de la conduite en PVC

Travaux sous chaussée, côté habitations

Zone chantier clôturée par des barrières

Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

ZONE I : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire



ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

**Phase 2 : ZONE 1 et 2
DU 3 OCTOBRE A MI
OCTOBRE**

Travaux : Reprises de tous les branchements

Travaux sous chaussée / limite de propriétés,

Zone chantier clôturée par des barrières

Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

**Phase 3 : CARREFOUR
AVENUE DES
OSTREICULEURS / ALLEE
DES ECLUSES**

PREVU LE 20/21 OCTOBRE

Travaux : Raccordement du réseau sur le carrefour

Durée : 2 jours

TRAVAUX EN ROUTE BARREE

Déviations mises en place

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

Z
gi

Phase 4 : ZONE 3

DU 24 OCTOBRE A FIN OCTOBRE

Travaux : Renouvellement de la conduite en PVC
Travaux sous chaussée, côté habitations
Zone chantier clôturée par des barrières
Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.
Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

ZONE
Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire


Phase 5 : CARREFOUR AVENUE DES OSTREICULEURS / ALLEE DES CORDIERS PREVU LE 2/3 NOVEMBRE

Travaux : Raccordement du réseau sur le carrefour

Durée : 2 jours

TRAVAUX EN ROUTE BARREE

Déviation mise en place

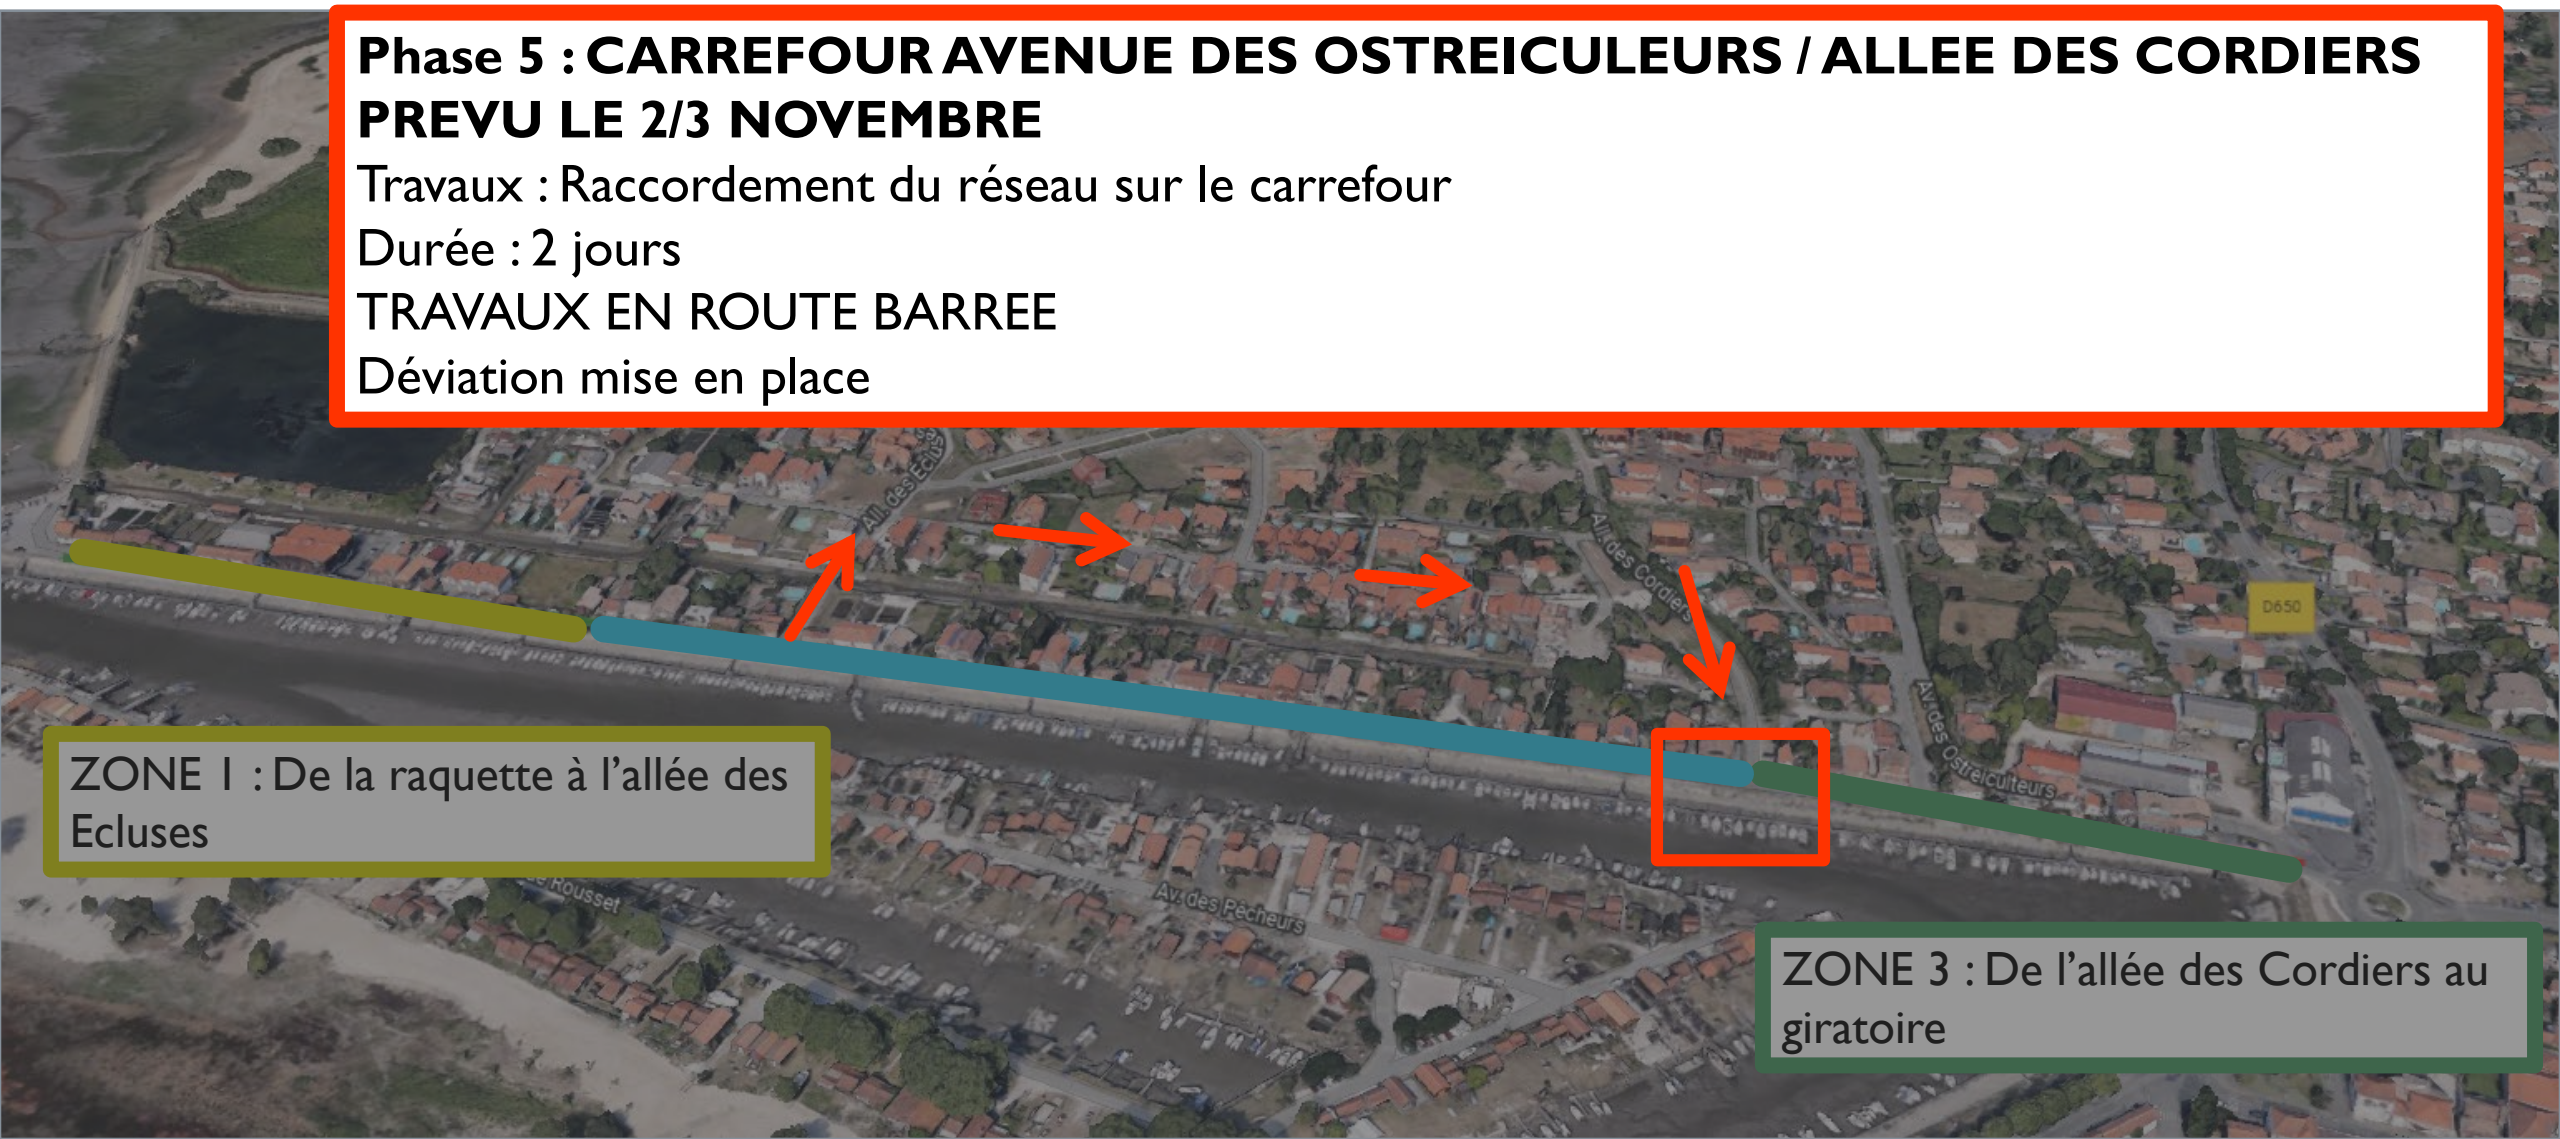

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

Phase 6 : ZONE 3

DE DEBUT NOVEMBRE A MI NOVEMBRE

Travaux : Reprises de tous les branchements
Travaux sous chaussée / limite de propriétés,
Zone chantier clôturée par des barrières
Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h
à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors
des horaires de chantier.

Ecluses à

ZONE 1 : D
Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au
giratoire

Travaux enfouissement

- MOA : SDEEG
- Enfouissement réseaux électriques et télécom (+ fibre optique)
- 25 poteaux à déposer

TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC ET PRIVE


Conventions / Autorisations à établir entre les prioritaires et les concessionnaires (SDEEG et GRDF)



Si convention pas établie à ce jour ou contact pas pris , merci de contacter les Services Techniques



Exemple de coffret à installer en limite de propriété

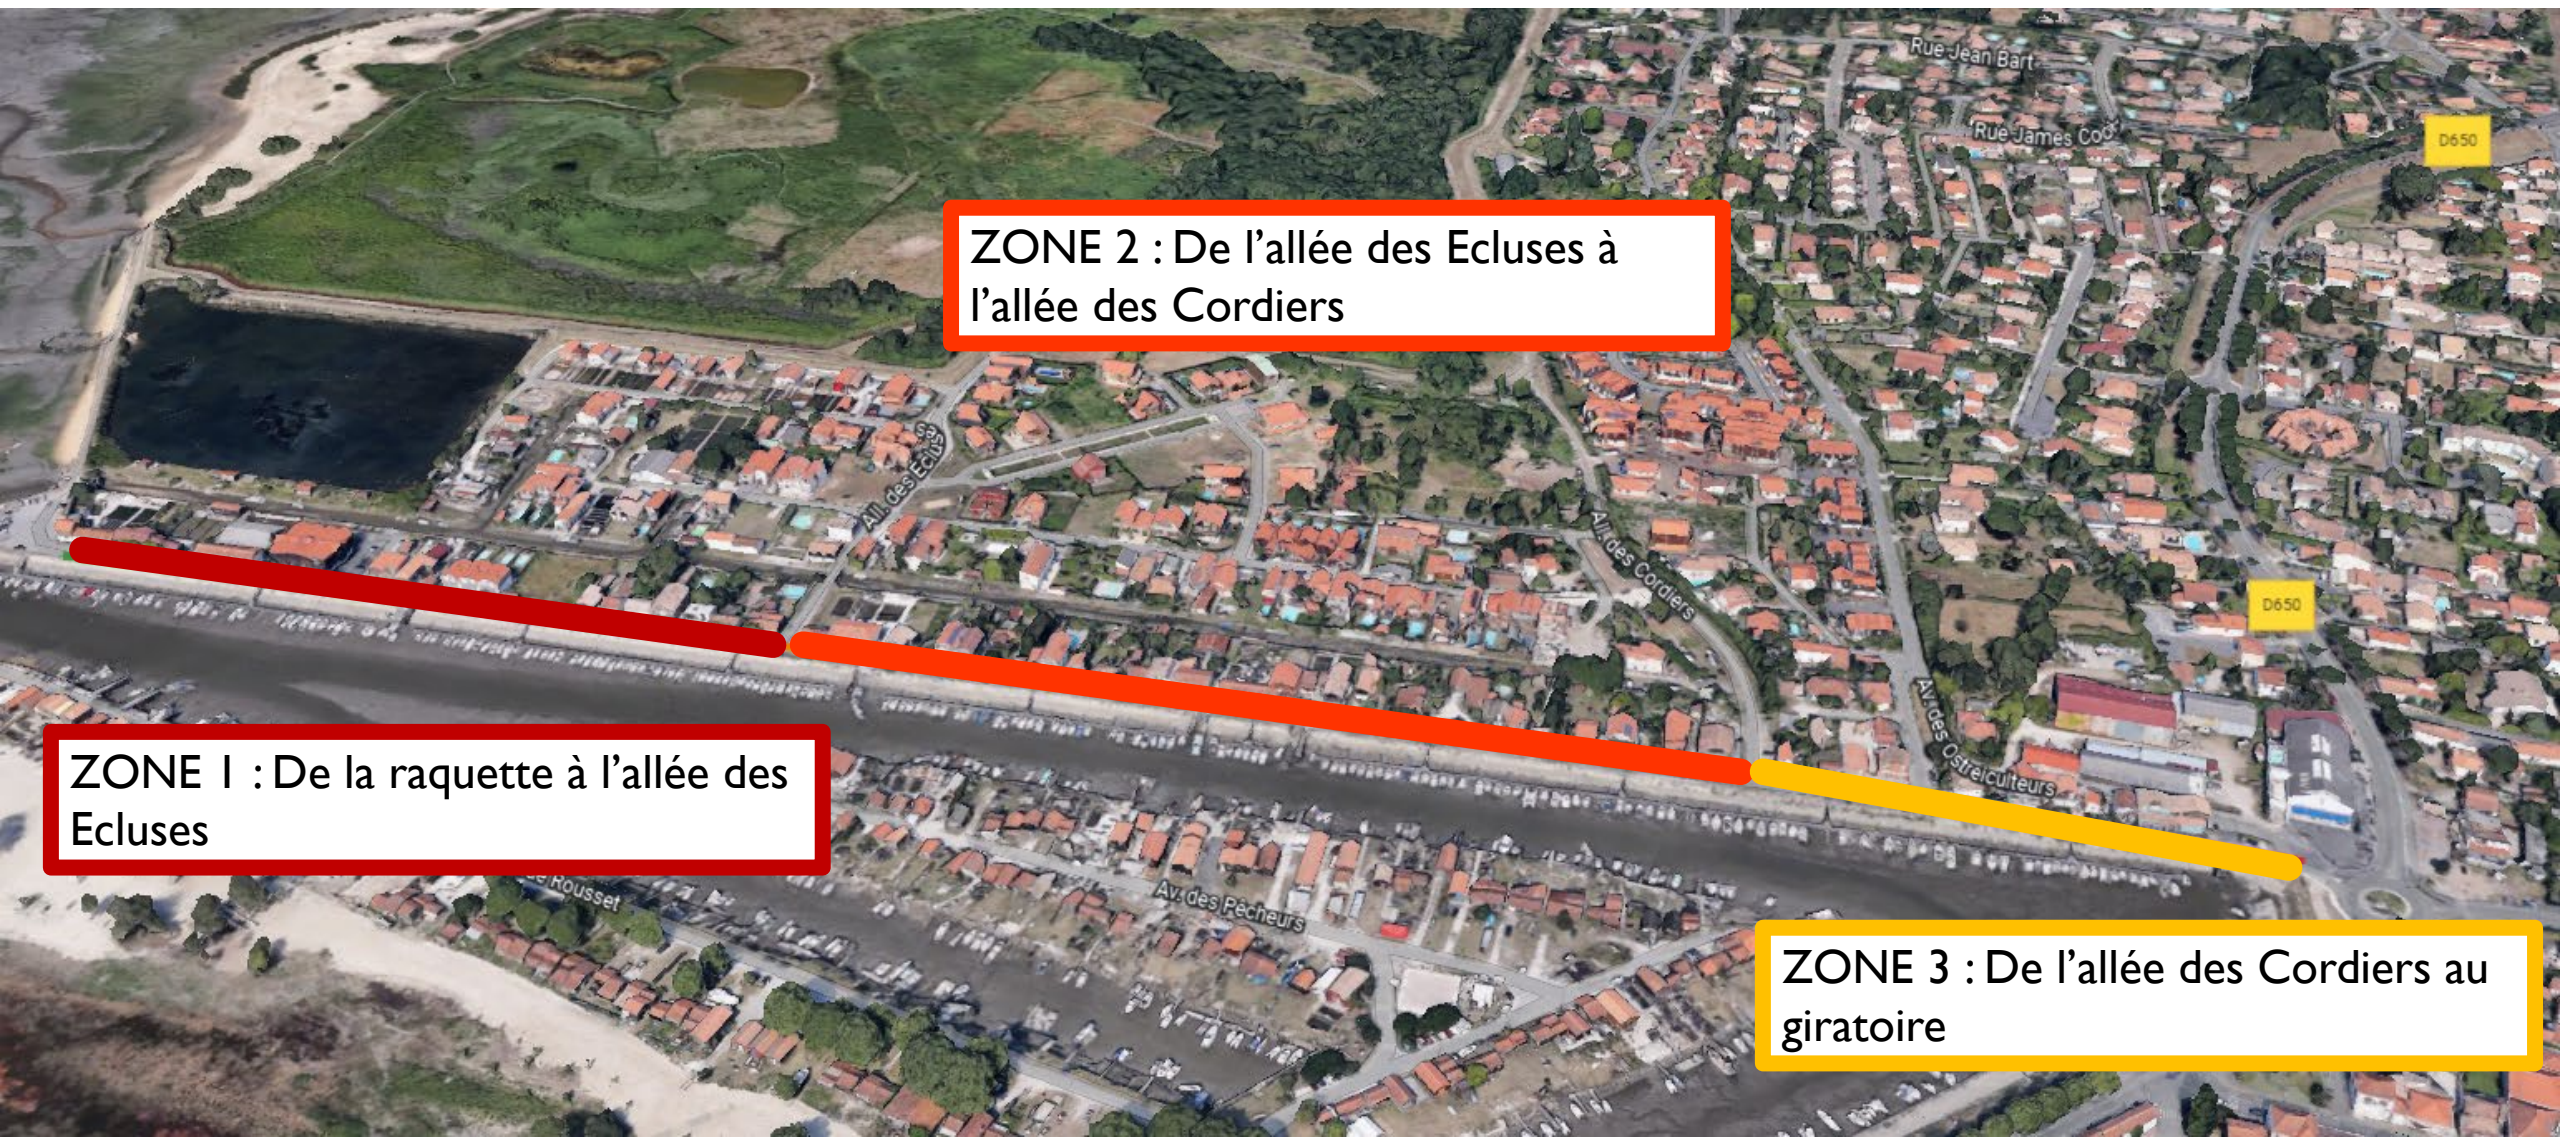

ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

Phase 7 : MI NOVEMBRE

Travaux AEP : Réfection des tranchées en enrobé
Travaux enfouissement : Travaux en domaine privé
Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.
Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

TRAVAUX ENFOUISSEMENT - PHASAGE

ZONE I :

Travaux de terrassement : Novembre – Décembre 2022

Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

Câblage et raccordement : Janvier 2022

Mise en service du nouveau réseau : Mars / Avril 2022

ZONE I : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

TRAVAUX ENFOUISSEMENT - PHASAGE

ZONE 2 :

Démarrage des terrassements : Janvier – Février 2023

Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

Câblage et raccordement : Février 2023

Mise en service du nouveau réseau : Mars / Avril 202

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

ZONE 3 :

Démarrage des terrassements : Février - Mars 2023

Gestion de la circulation par feux tricolores de 8h à 17h.

Fouilles balisées et chaussée rétrécie en dehors des horaires de chantier.

Câblage et raccordement : Mars 2023

Mise en service du nouveau réseau : Mars / Avril 202

ZONE 1 : De la raquette à l'allée des Ecluses

ZONE 2 : De l'allée des Ecluses à l'allée des Cordiers

ZONE 3 : De l'allée des Cordiers au giratoire

GESTION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

- Circulation maintenue Avenue des Ostréiculteurs
- Mise en place d'un alternat par feux de début octobre 2022 à mars 2023
- Arrêt de chantier du 16 décembre 2022 au 3 janvier 2023
- Fin des travaux de terrassement fin mars 2023
- Stationnement interdit au droit du chantier
- Circulation piétonne maintenue ou déviée ponctuellement
- Desserte des riverains ainsi que l'accès des secours maintenus

LOCALISATION DE LA BASE VIE



LA SUITE DES TRAVAUX – ECLAIRAGE PUBLIC

- Toutes les installations d'éclairage ne doivent plus éclairer **directement** (*ref **alinéa V de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2018** relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses*) :
 - Les cours d'eau
 - Le domaine public fluvial (DPF)
 - Les plans d'eau
 - Les lacs et étangs
 - Le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime)
- **Modernisation de l'éclairage : Tirage d'un nouveau câblage du réseau - Pose de nouveaux candélabres (mâts) et lanternes LED pour une uniformité lumineuse**
- **Mise en place d'un système de gradation**

LA SUITE DES TRAVAUX – ECLAIRAGE PUBLIC

- Ce dispositif permet :
 - Extinction de l'éclairage sans présence
 - Allumage progressif qui suit l'obstacle détecté, permettant d'avoir un tronçon lumineux d'environ 3 luminaires, garantissant une uniformité d'éclairement.
 - Extinction au bout de 15 secondes, une fois l'obstacle hors du champ de détection.



LA SUITE DES TRAVAUX – AMÉNAGEMENT SMPBA

- **PROFIL TYPE ET TOPO ? ALAIN**



TRAVAUX – AVENUE DES OSTREICULTEURS CENTRE-VILLE

MAIRIE DE LA TESTE DE BUCH



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Mercredi 28 septembre 2022
