HÔTEL DE VILLE
Esplanade Edmond Doré
B.P. 50105 ■ 33164 ■ LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 56 22 35 00
www.latestedebuch.fr

TRAVAUX
RUE DU PORT
LA TESTE DE BUCH

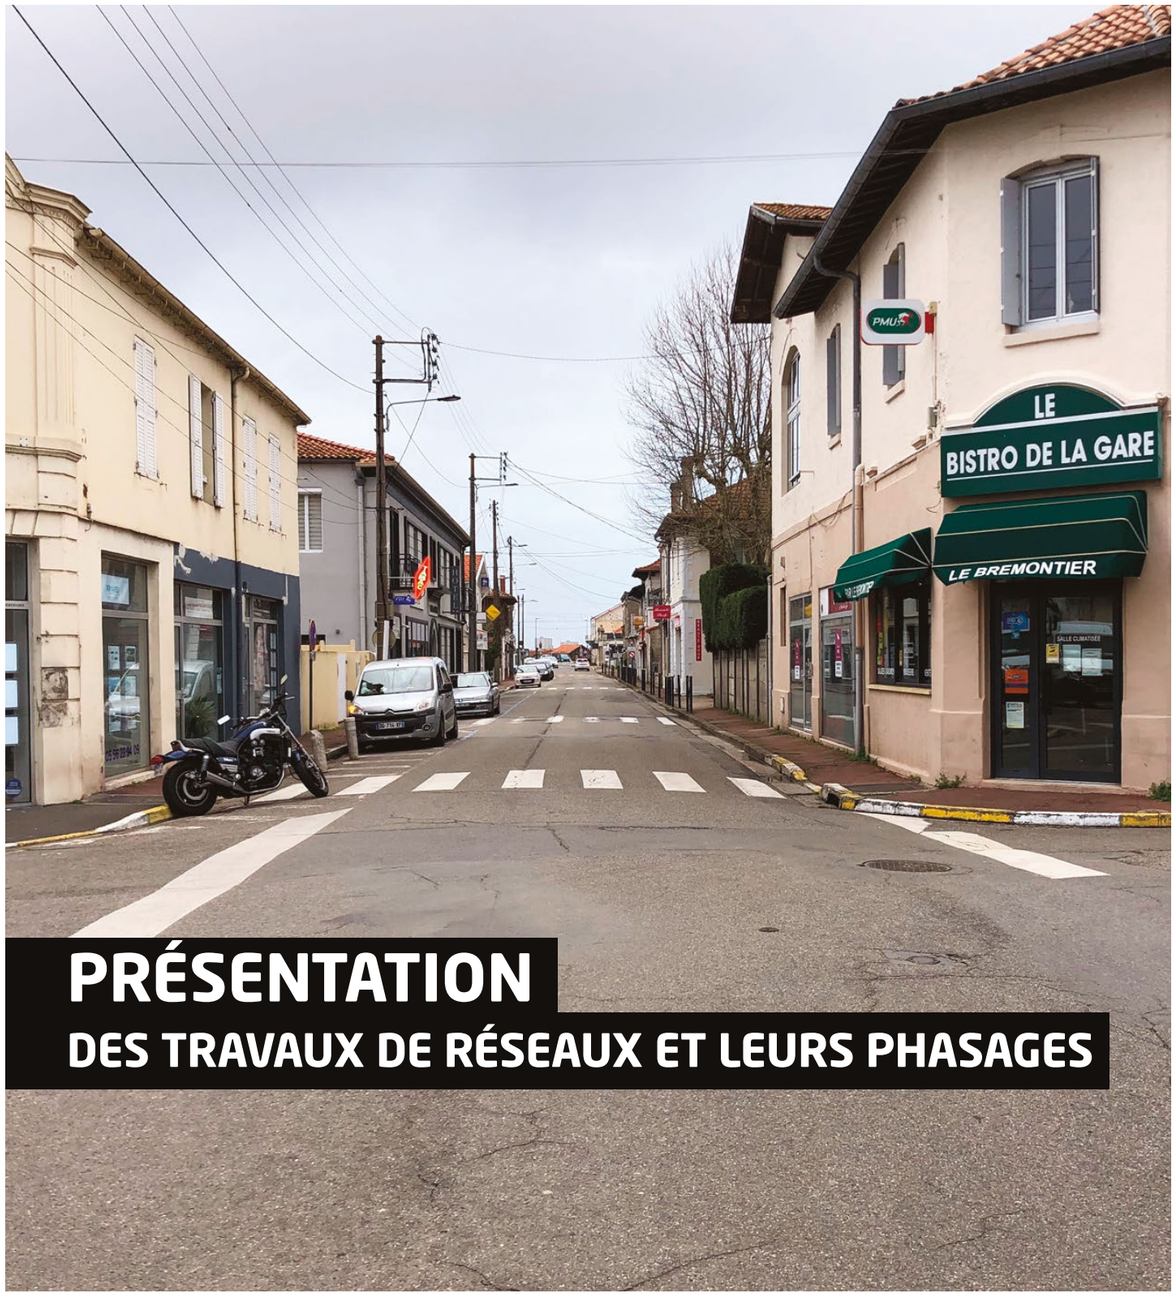

PRÉSENTATION
DES TRAVAUX DE RÉSEAUX ET LEURS PHASAGES

Travaux concessionnaires rue du Port

La rue du Port sera réaménagée en 2023 afin de créer une liaison agréable pour tous les modes de déplacement entre le centre-ville et la façade maritime. En amont, en 2022, les réseaux d'eau potable et gaz doivent être renouvelés par les concessionnaires et les réseaux électriques et télécom enterrés en partenariat avec le SDEEG et ORANGE.

Les travaux sont prévus dès le mois de mars 2022, avec le renouvellement de la canalisation d'eau potable et de tous ses branchements, sous maîtrise d'ouvrage COBAS. Divisés en phases, ces travaux dureront jusqu'à mi-mai. S'en suivront les travaux de renouvellement de la canalisation gaz, sous maîtrise d'ouvrage GRDF et enfouissement des réseaux, sous maîtrise d'ouvrage SDEEG. Une première partie sera réalisée avant la saison estivale puis lors du dernier trimestre de l'année.

ARRÊT DU CHANTIER ET RETOUR À LA CIRCULATION NORMALE PENDANT LA SAISON ESTIVALE

La circulation de la rue du Port sera **modifiée à partir du 7 mars** pour permettre la réalisation des travaux avec la mise en sens unique dans le centre sud-nord, selon ce phasage :

7 MARS > MI MAI : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE
Phase 1 : Pl. Jean Hameau / Inters. Pasteur-Foch
Phase 2 : Inters. Pasteur-Foch / voie ferrée
Phase 3 : Voie ferrée / giratoire Leclerc
Phase 4 : Rue Pierre Dignac

MI MAI > DÉCEMBRE 2022 : TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RÉSEAUX GAZ
Phase 1 : Pl. Jean Hameau / Inters. Pasteur-Foch
Phase 2 : arrêt juillet/août
Phase 3 : Inters. Pasteur / rue A. Dignac
Phase 4 : Rue A. Dignac / giratoire Leclerc

Travaux concessionnaires 2022

COBAS Communauté d'Agglomération Bassin d'Arcachon Sud — SDEEG Notre énergie au service des territoires — GRDF Gaz Réseau Distribution France — orange

Contacts

TRAVAUX EAU POTABLE

• Responsable du projet
COBAS
Pascal SENMARTIN
psenmartin@agglo-cobas.fr
06.02.00.37.79

• Maître d'œuvre
VIA INFRASTRUCTURES
Jean-François VIALLARD
jf.viallard@via-infra.com
07.62.77.48.66

• Gestionnaire du réseau
SOBASS
Philippe BOREL
philippe.borel@sobass.fr
06.16.47.33.17

• Entreprise réalisant les travaux
CHANTIERS D'AQUITAINE
Charly BOGAR
Conducteur de travaux
charly.bogar@exedra.fr
06.12.70.95.42

TRAVAUX DE GAZ

• Responsable du projet
GRDF
Mathieu DUCOM
mathieu.ducom@grdf.fr
06.40.47.34.97

• Entreprise réalisant les travaux
BOUYGUES ENERGIE
Maxime LAILHEUGUE
Conducteur de travaux
m.lailheugue@bouygues-es.com

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

• Responsable du projet
SDEEG
Jean-Marc COLLY
Chargé de projets
jeanmarc.colly@sdeeg33.fr
06.88.38.21.01

Joachim MARTIN
Responsable du bureau d'études
06.08.00.93.44

• Entreprise réalisant les travaux
EIFFAGE ENERGIE
Lucille RAIMBAULT
Responsable d'affaire
lucille.raimbault@eiffage.com
06.26.42.22.05

SERVICES TECHNIQUE DE LA VILLE

Accueil
servicestechniques@latestedebuch.fr
05.57.52.97.30

Christophe FURIC
Contrôleur de travaux
christophe.furic@latestedebuch.fr
06.64.96.64.91

Joris BOREL
Responsable d'Exploitation des réseaux secs et du réseau d'éclairage public
joris.borel@latestedebuch.fr
06.70.96.80.48

POLICE MUNICIPALE

0 800 943 333 Service & appel gratuits

LA TESTE DE BUCH
BASSIN D'ARCACHON

TRAVAUX RUE DU PORT
PHASAGE PRÉVU

2022 : intervention des concessionnaires

MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET / AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	2023

7 mars - mi mai 2022
Travaux de renouvellement
de la conduite d'eau potable

mi mai - décembre 2022
Travaux d'enfouissement réseaux et gaz

Travaux d'aménagement

PHASE 1
7 mars - 8 avril
Place Jean Hameau
Intersection
Pasteur / Foch

PHASE 2
28 mars - 29 avril
Intersection
Pasteur / Foch
Voie ferrée

PHASE 3
19 avril - 6 mai
Voie ferrée
Giratoire Leclerc

PHASE 4
9 mai - 20 mai
rue A. Dignac

PHASE 1
Mi mai - fin juin + septembre
de la place J.Hameau à l'intersection Pasteur / Foch

PHASE 2
ARRÊT DE CHANTIER
EN PÉRIODE ESTIVALE 2022

FIN DE LA PHASE 1

PHASE 3
septembre - octobre
de l'intersection Pasteur / Foch à la rue A. Dignac

PHASE 4
novembre - décembre
de la rue A.Lesca au giratoire Leclerc

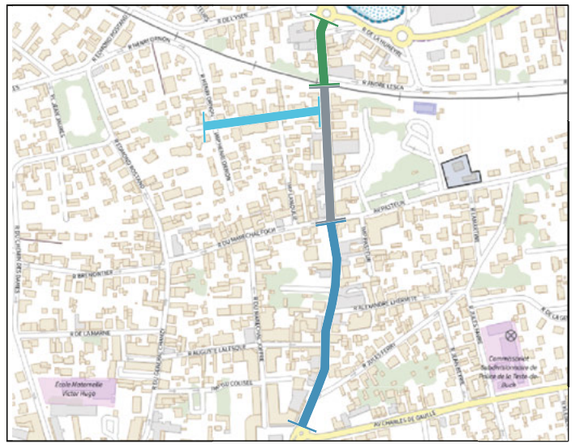

Travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable

- PHASE 1
- PHASE 2
- PHASE 3
- PHASE 4

COBAS
Bassin d'Arcachon Sud

NATURE DES TRAVAUX :

- Renouvellement de la conduite d'AEP en fonte diam 150
- Reprises de tous les branchements
- Réfection en enrobé à chaud par phase (remise en état des fouilles suite mise en pression et potabilité)
- Zone chantier clôturée par des barrière HERAS
- Zone libérée selon l'avancement et par phase

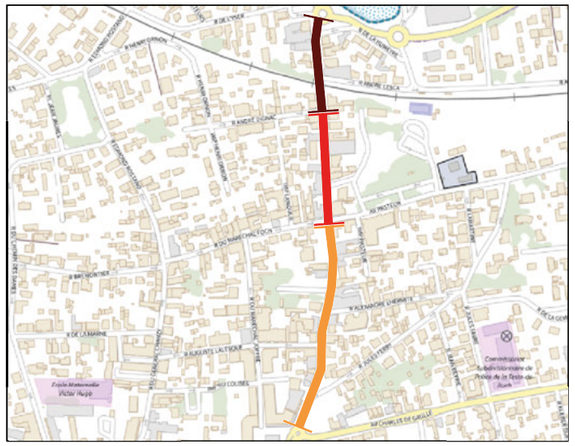

Travaux d'enfouissement réseaux et gaz

- PHASE 1
- PHASE 3
- PHASE 4

SDEEG
GRDF
orange

NATURE DES TRAVAUX :

- Enfouissement des réseaux électriques et télécommunication en partie publique et privée
- Renouvellement de la canalisation gaz en partie publique et privée
- Mutualisation des travaux
  > tranchée commune
  > optimisation et gain de temps

IMPLANTATION RÉSEAU : sous les places de stationnement → EMPRISE CHANTIER : places de stationnement + demi-chaussée
= MISE EN SENS UNIQUE SANS POSSIBILITÉ DE STATIONNEMENT AU DROIT DES TRAVAUX

Sens de circulation : début mars à fin juin (retour à une circulation normale pendant la période estivale)

Du 7 mars à fin mars

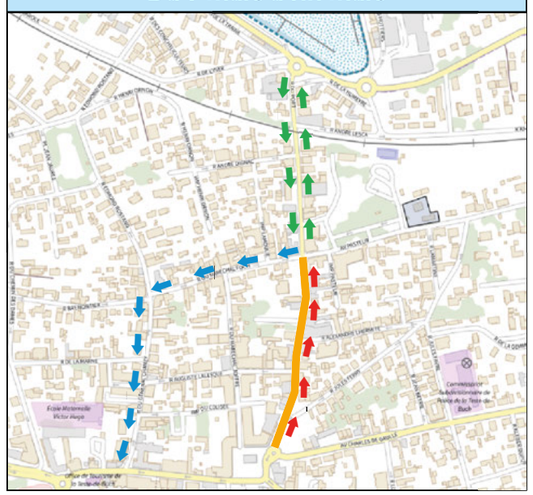

- **Mise en sens unique de la rue du Port**
  de la place Jean Hameau à l'intersection rue Foch/avenue Pasteur
- **Modification sens de circulation**
  de la rue du Maréchal Foch et rue du Général Chanzy
- **Circulation en double sens**
- **Zone de travaux**

De fin mars à mi avril

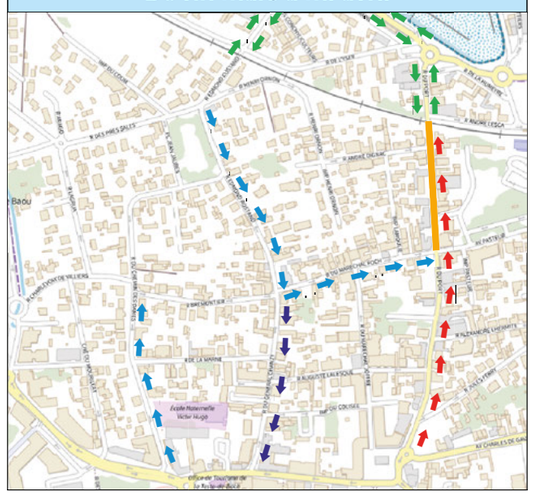

- **Prolongement du sens unique de la rue du Port**
  de la place Jean Hameau à l'intersection rue Lesca
- **Maintien sens de circulation**
  rue du Général Chanzy
- **Modification sens de circulation**
  de la rue Edmond Rostand, rue du Maréchal Foch et
  de la rue du Chemin des dames (pour faciliter l'accès Teste Nord)
- **Circulation en double sens**
- **Zone de travaux**

De mi avril à début mai

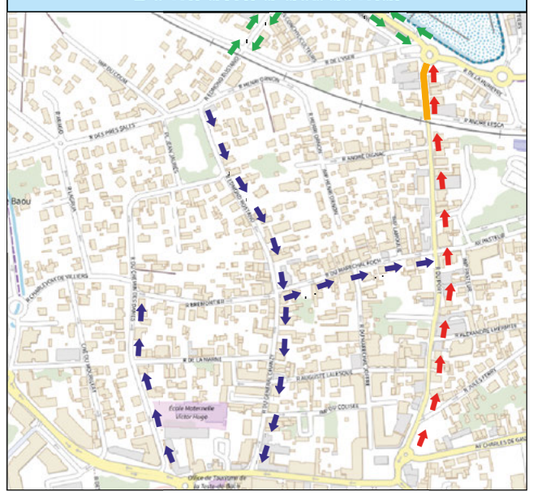

- **Prolongement du sens unique de la rue du Port**
  de la place Jean Hameau au giratoire du Boulevard du Gal Leclerc
- **Maintien sens de circulation**
  de la rue du Maréchal Foch et rue du Général Chanzy,
  de la rue Edmond Rostand et rue du Chemin des dames
- **Circulation en double sens**
- **Zone de travaux**

De début mai à fin juin

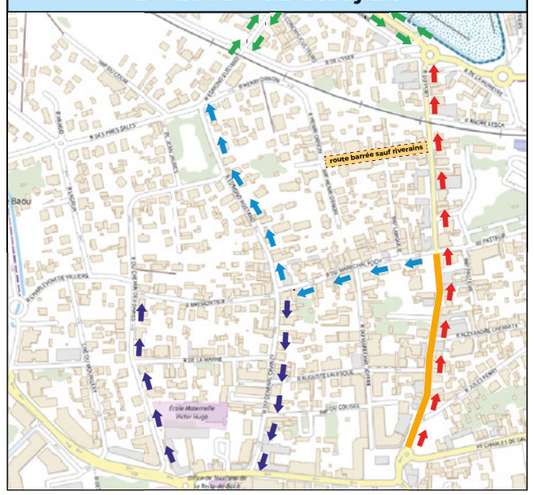

- **Maintien du sens unique de la rue du Port**
  de la place Jean Hameau au giratoire du Boulevard du Gal Leclerc
- **Maintien sens de circulation**
  de la rue du Gal Chanzy et rue du Chemin des dames
- **Modification sens de circulation**
  de la rue du Maréchal Foch et rue Edmond Rostand
- **Circulation en double sens**
- **Travaux sur la rue André Dignac** en route barrée sauf riverains (du 9 au 20 mai)
- **Zone de travaux**

LA TESTE DE BUCH
BASSIN D'ARCACHON

TRAVAUX RUE DU PORT
STATIONNEMENT ET CHANTIER

Les stationnements seront balisés le temps des travaux, par phase, et libérés autant que possible selon l'avancement du chantier

FOCUS SUR LES COMMERCES ET LES STATIONNEMENTS

Recensement commerces dans la rue du Port :
- Activité plus dense côté sud place Jean Hameau
- Une cinquantaine de commerces

Recensement et offre de stationnements existants sur le domaine public :

Parking rue Jules Ferry	**11 places + 2 PMR**
Parking Chanzy	**49 places + 1 PMR**
Parking Gare	**83 places + 3 PMR**
Parking Yser	**20 places + 2 VL électriques (côté PM)** **7 places + 1 PMR**
Place Jean Hameau	**13 places**
Avenue de Gaulle (proche pharmacie et restaurant)	**6 places**
Rue Jules Ferry	**17 places**
Rue Auguste Lalesque	**7 places**
Rue Alexandre Lhermite	**19 places**
Avenue Pasteur	**16 places**
Rue du Maréchal Foch	**14 places**
Rue de la Humeyre	**11 places + 1 PMR**
Rue du Port entre Jean Hameau et Lalesque	**15 places**
Rue du Port entre Lalesque et Foch/Pasteur	**15 places**
Rue du Port entre Foch et le giratoire Leclerc	**21 places**

Stationnements sur rue
Parkings
Stationnements par zone impactée et libérée au fur et à mesure selon l'avancement des travaux.

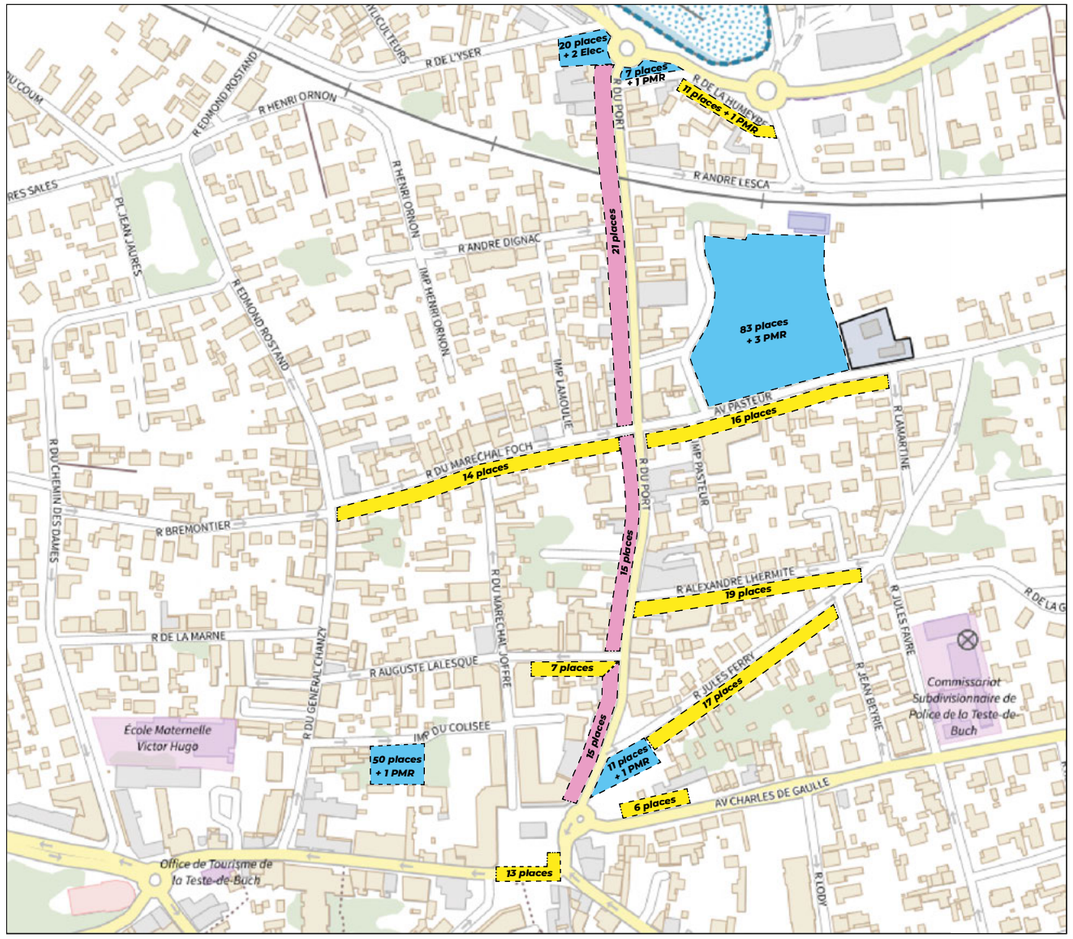

1ère Phase de travaux : principe du stationnement par zone

Du 7 mars au 28 mars, soit 3 semaines

- **Pour conserver un maximum de stationnements, division en 2 zones :**
  Zone 1 : entre la place J. HAMEAU et rue LALESQUE
  Zone 2 : entre la rue LALESQUE et FOCH / PASTEUR
- **Stationnements libérés au fur et à mesure**
- **Zone de chantier bien clôturée pour sécuriser le chantier**

Travaux concessionnaires 2022

COBAS Communauté d'Agglomération Bassin d'Arcachon Sud — SDEEG Notre énergie au service des territoires — GRDF Gaz réseau distribution France — orange

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT À VENIR

PHASE 1 - ZONE 1

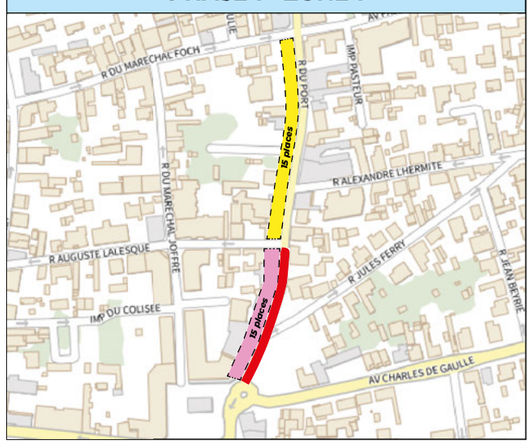

PHASE 1 - ZONE 2

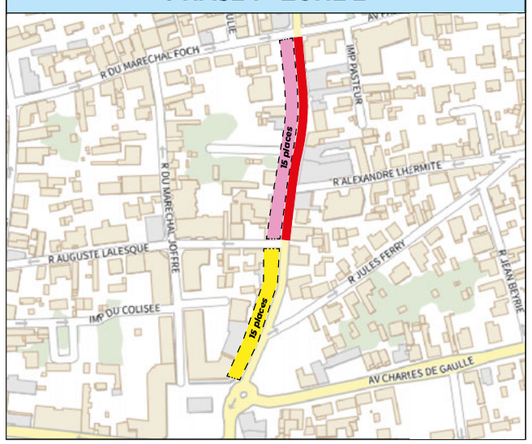

Stationnements disponibles — **Zone de travaux** — **Zone de stationnements neutralisée temporairement.**
